



LEAN-RAKENTAMISEN PÄIVÄT 2026

Ymmärrys yhdistää

5.-6.5.2026, Helsinki

 LEAN CONSTRUCTION
INSTITUTE - FINLAND

 ril

Hankeohjelman strateginen johtaminen - havaintoja ja oppeja LYS-allianssista

**Ossi
Inkilä**

SRV Rakennus Oy

**Sari
Koskelo**

Vison Oy

LYS-allianssin hankestrategia

Hankkeen
yhteinen
kulttuuri ja
osaamisen
vahva
integraatio

LYS
way


Ympäristö ja
vastuullisuus
tekemisen
keskiössä

Lean-
rakentamisen ja
digitalisaation
hyödyntäminen


Työmaa-
logistiikkaan
panostaminen


TVD-prosessin
mukainen
toiminta

Matka yhteiseen päämäärään

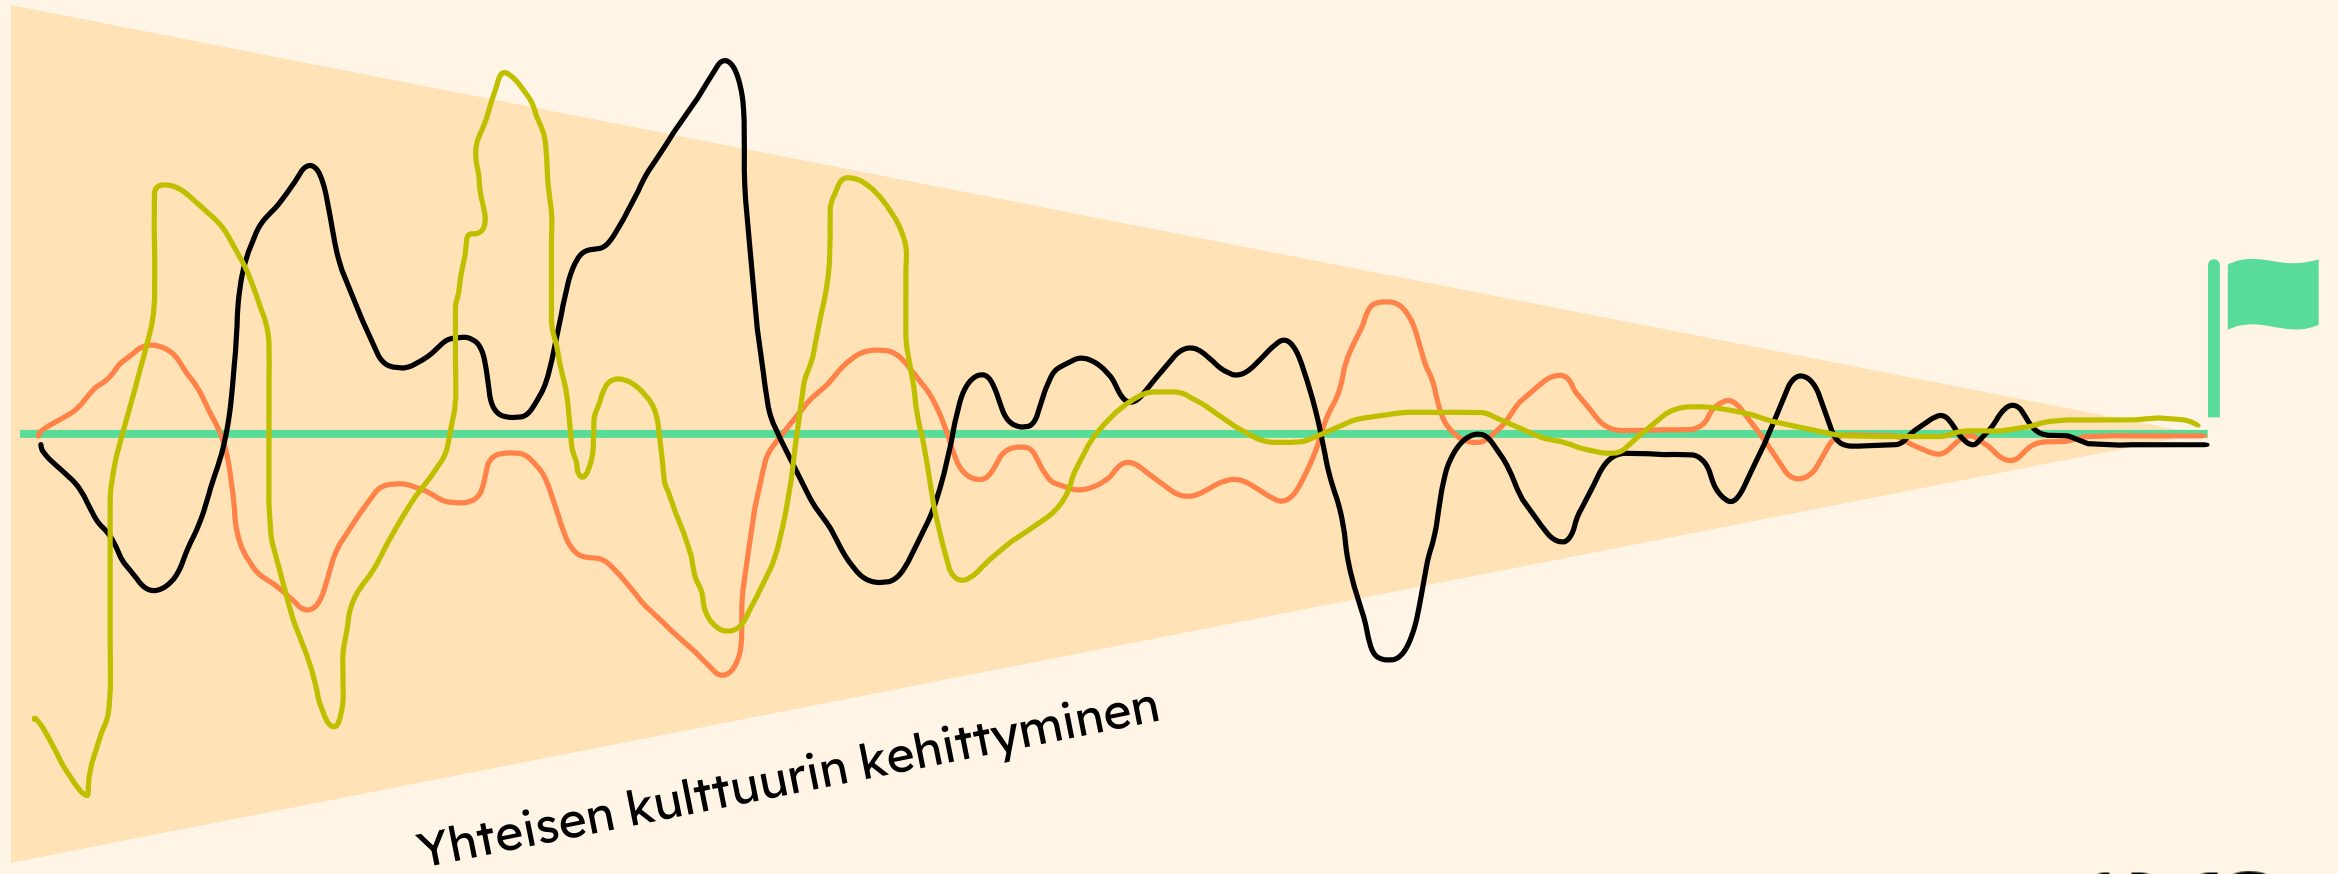

Miksi tiimit onnistuvat paremmin, kun odotukset ovat korkeat ja tuki vahvaa?

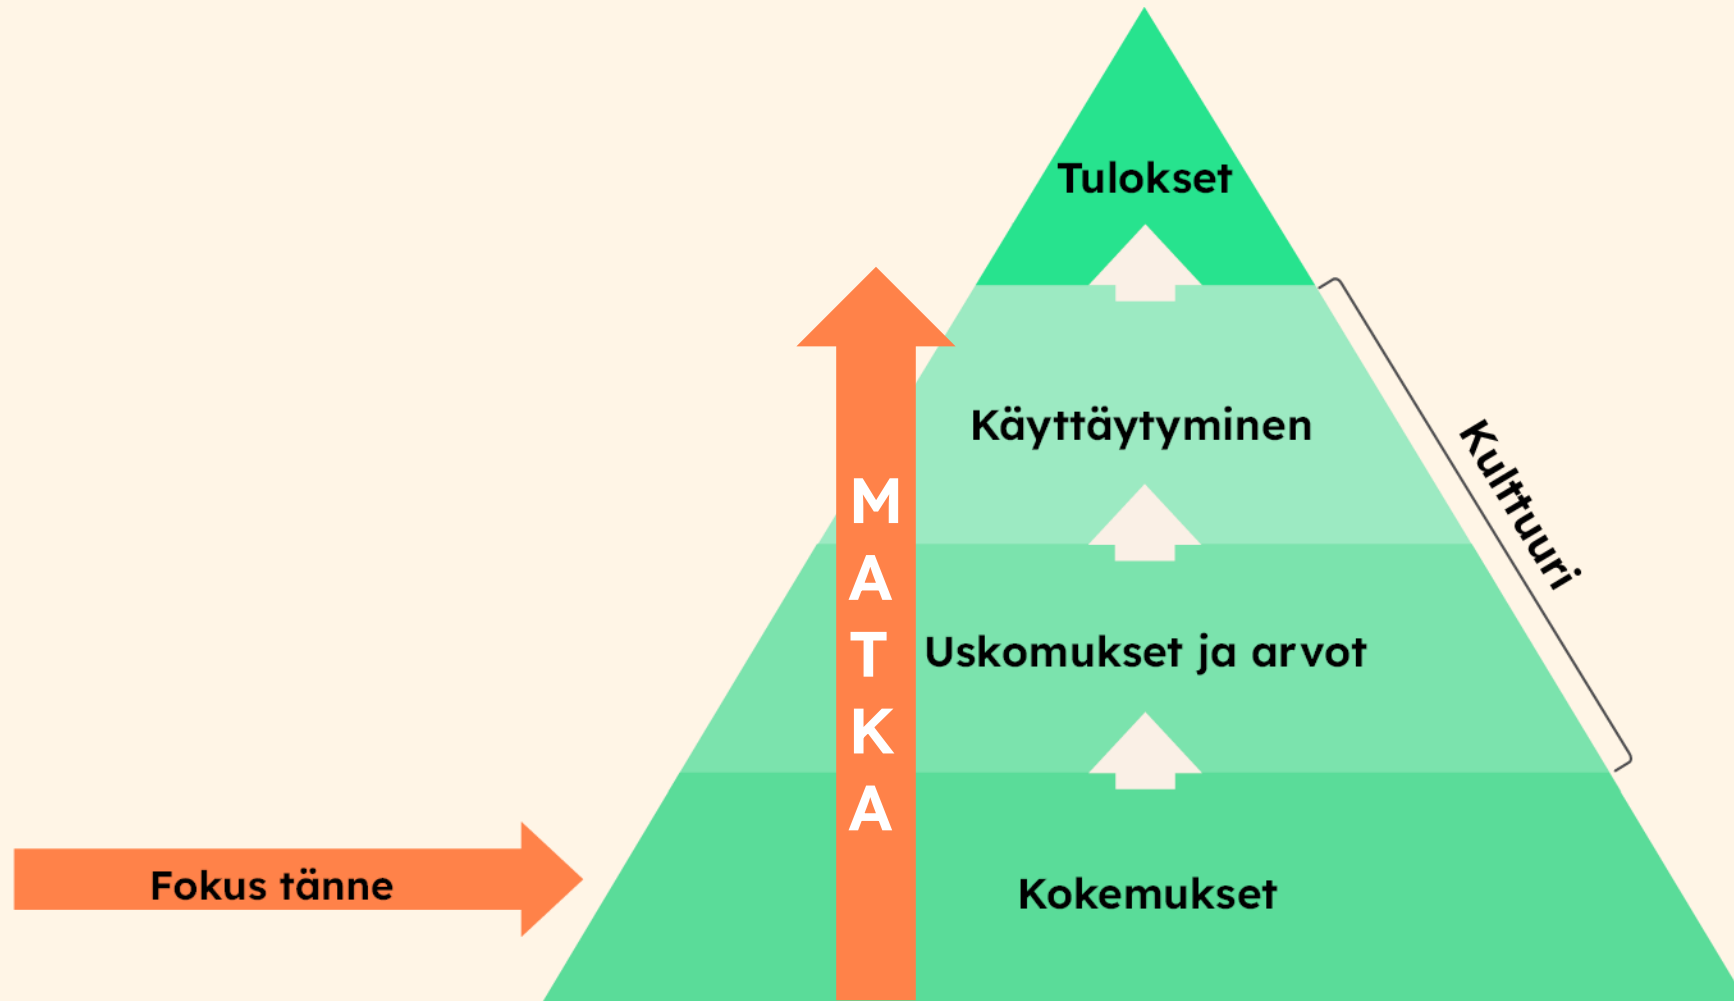

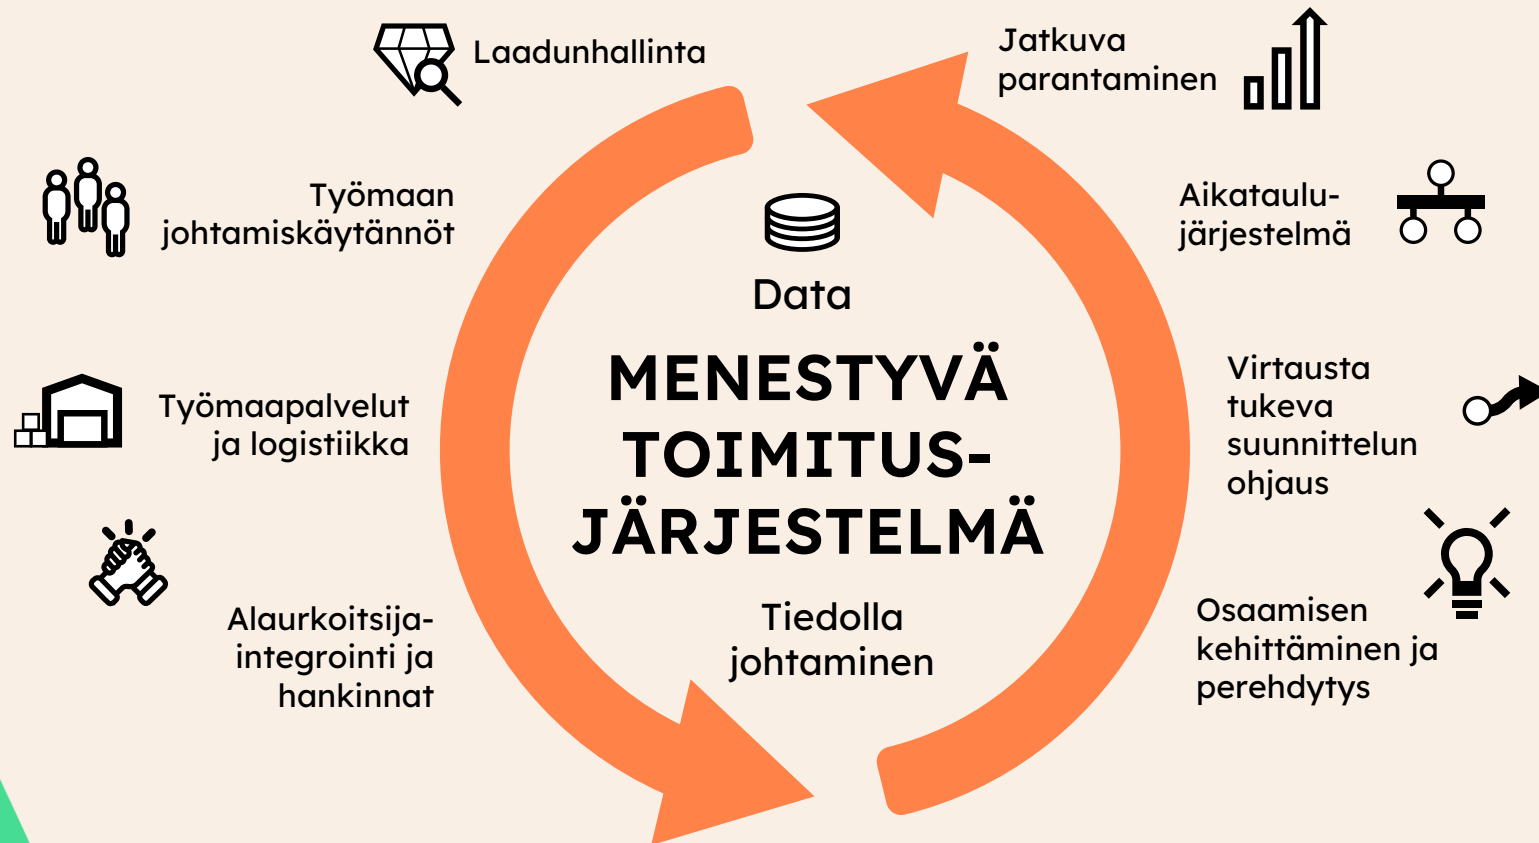

Iso sairaalahanke kaupungin keskustassa, tiukka budjetti- ja aikatauluraami

12 kuukautta referenssi-projekteja nopeammin

Tahtituotanto: yhden päivän tahti, tahtialueen koko suurempi kuin 200 m²

Päivittäisjohtaminen tahtisuunnitelman mukaan

Jatkuva parantaminen

Fokus eri hankkeen vaiheissa

Kehitysvaihe
TARGET VALUE DESIGN
OIKEAN PROJEKTIN TOIMITTAMINEN
Varmistetaan, että tilaajalle toimitetaan lopputuote, jossa arvo toteutuu

Toteutusvaihe
TARGET VALUE DELIVERY
TOIMITETAAN PROJEKTI OIKEIN
Rakennetaan suunniteltua vastaava lopputuote

Yhdessä!

SUUNNITTELU
tutkimus
simulointi
mallinnus
lupauksen antaminen

TOTEUTTAMINEN
rakentaminen
luovutus ja käyttöönotto
lupauksen lunastaminen

1 ARVON
MÄÄRITTELY



ARVON
TODENTAMINEN **4**

Ymmärryksen luominen on osa kulttuuria



Ymmärrys: mitä, miksi ja miten?

Ymmärryksen varmistaminen ja henkilöiden sitouttaminen

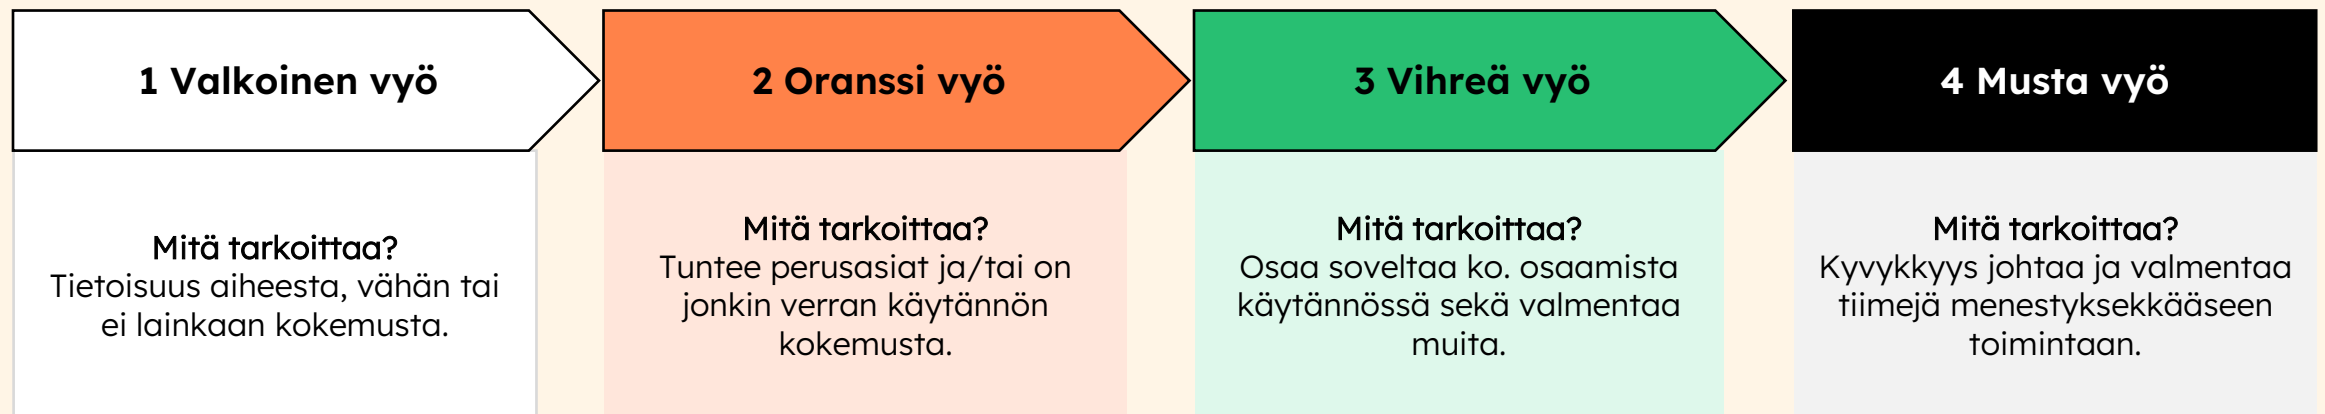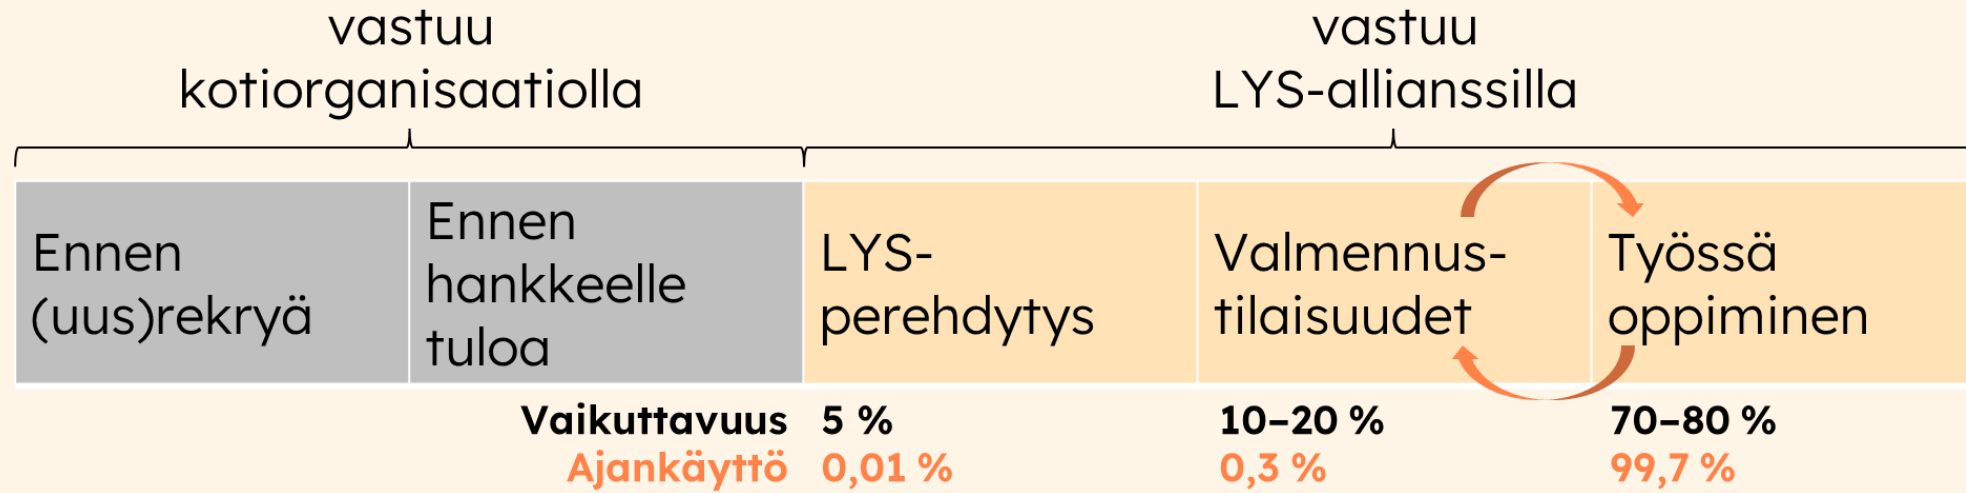

Yhteenveto

**Yhteinen
päämäärä**

**Yhteiset
toimintamallit
ja prosessit**

**Osaava ja
sitoutunut
organisaatio**

Yhteinen kulttuuri
